N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	% achevé
1		**Autorisation de construire**	**194 jours**	**Mer 09.10.24**	**Lun 21.07.25**		**6%**
2		Proposition variante finition bardage par l'architecte	2 semaines	Mer 09.10.24	Mar 22.10.24		100%
3		Avant-projet (compartimentage feu, rénovation des façades) - Finalisation avec le CERN	0 jour	Ven 15.11.24	Ven 15.11.24		0%
4		Synthèse dossier autorisation de construire	2 semaines	Ven 15.11.24	Jeu 28.11.24	3	0%
5		Pré-instruction du dossier auprès des offices cantonales	3 semaines	Lun 02.12.24	Ven 20.12.24	4	0%
6		Dépôt autorisation de construire auprès des autorités (Rénovation des façades, Travaux enterrés raccordement entre B200 et Extension B3165, Extension 3165)	1 jour	Lun 06.01.25	Lun 06.01.25	5;20FD+2 semaines	0%
7		Instruction autorisation de construire	7 mois	Mar 07.01.25	Lun 21.07.25	6	0%
8		**Projet rénovation des façades 200/201**	**89 jours**	**Lun 03.08.26**	**Jeu 03.12.26**		**0%**
9		Travaux rénovation des façades - rendu documents appels d'offres	0 jour	Lun 03.08.26	Lun 03.08.26		0%
10		Dispatch CERN (corrections IPT doc, HSE check, spec committee, etc)	20 jours	Lun 03.08.26	Ven 28.08.26	9	0%
11		Specification committee	0 jour	Ven 04.09.26	Ven 04.09.26	10FD+5 jours	0%
12		Approbation/Echange avec IPT	10 jours	Lun 07.09.26	Ven 18.09.26	11	0%
13		Mises à jour documents appels d'offres - Archiplein	5 jours	Lun 07.09.26	Ven 11.09.26	12DD	0%
14		Lancement appel d'offres avec MS 4932	6 semaines	Lun 21.09.26	Ven 30.10.26	12	0%
15		Clarifications	3 semaines	Lun 02.11.26	Ven 20.11.26	14	0%
16		Proposition adjudication IPT	4 jours	Lun 23.11.26	Jeu 26.11.26	15	0%
17		Contrat IT signé/DAI	5 jours	Ven 27.11.26	Jeu 03.12.26	16	0%
18		**Projet raccordement zone enterrée entre B200 et B3165**	**242 jours**	**Lun 07.10.24**	**Mer 24.09.25**		**4%**
19		Choix entre les 2 variantes proposées - Retour CERN	5 jours	Lun 07.10.24	Ven 11.10.24		100%
20		Documentations autorisation de construire à transmettre à ARCHIPLEIN	0 semaine	Lun 11.11.24	Lun 11.11.24	19	100%
21		Travaux enterrés raccordement B200/Extension B3165 - rendu documents appels d'offres	1,5 mois	Lun 11.11.24	Ven 20.12.24	20	0%
22		Retour remarques CERN	2 semaines	Lun 06.01.25	Ven 17.01.25	21	0%
23		Dispatch CERN (corrections IPT doc, HSE check, spec committee, etc)	4 semaines	Lun 20.01.25	Ven 14.02.25	22	0%
24		Specification committee	0 jour	Ven 21.02.25	Ven 21.02.25	23FD+5 jours	0%
25		Approbation/Echange avec IPT	10 jours	Lun 24.02.25	Ven 07.03.25	24	0%
26		Mises à jour documents appels d'offres - OU3	5 jours	Lun 24.02.25	Ven 28.02.25	25DD	0%
27		Lancement appel d'offres avec MS 4845	6 semaines	Lun 10.03.25	Ven 18.04.25	25	0%
28		Clarifications	5 semaines	Lun 21.04.25	Ven 23.05.25	27	0%
29		Proposition d'adjudication contrat IT	1 semaine	Lun 26.05.25	Ven 30.05.25	28	0%
30		Peers review meeting	0 jour	Mer 02.07.25	Mer 02.07.25	32DF-3 mois	0%
31		Approbation management	2 jours	Mer 16.07.25	Jeu 17.07.25	30FD+2 semaines	0%
32		Approbation FC	0 jour	Mer 24.09.25	Mer 24.09.25		0%
33		**Projet Extension B3165**	**50 jours**	**Lun 06.01.25**	**Ven 14.03.25**		**0%**
34		Etude EXE	6 semaines	Lun 06.01.25	Ven 14.02.25	21	0%
35		Chiffrage contrat cadre	4 semaines	Lun 17.02.25	Ven 14.03.25	34	0%
36		**Travaux GC MSHP**	**639 jours**	**Mar 27.05.25**	**Ven 19.11.27**		**0%**
37		**Projet rénovation des façades B200/201**	**639 jours**	**Mar 27.05.25**	**Ven 19.11.27**		**0%**
38		Préparation de chantier	2,5 mois	Lun 04.01.27	Ven 12.03.27	50FD+4 mois	0%
39		1er tranche - Bâtiment 200	5 mois	Lun 15.03.27	Ven 30.07.27	38	0%
40		2ème - Bâtiment 201	4 mois	Lun 02.08.27	Ven 19.11.27	39	0%
41		Toiture 201 (création ouverture + étanchéité)	3 mois	Lun 04.01.27	Ven 26.03.27	38DD	0%
42		Travaux extérieur (Gros oeuvre-Démolition annexe 201)	2 mois	Mar 16.09.25	Lun 10.11.25	43	0%
43		Travaux intérieur (Compartimentage feu)	2 mois	Mar 22.07.25	Lun 15.09.25	6FD+7 mois	0%
44		Travaux intérieur (Gros oeuvre)	2 mois	Mar 27.05.25	Mar 22.07.25	43DF	0%
45		Travaux intérieur (Dépose divers/Réseaux CVSE)	6 mois	Lun 28.09.26	Lun 15.03.27	39DF	0%
46		Travaux souterrains - Liaison B200/Point 1	6 mois	Mar 22.07.25	Lun 19.01.26	6FD+7 mois	0%
47		Extension B3165 - Travaux	5 mois	Mar 22.07.25	Lun 08.12.25	6FD+7 mois	0%
48		**Travaux annexe**	**325 jours**	**Lun 02.06.25**	**Ven 11.09.26**		**0%**
49		Projet ME9-ME10	2 mois	Lun 02.06.25	Ven 25.07.25		0%
50		Installations techniques B201	9 mois	Lun 05.01.26	Ven 11.09.26		0%
51		Passage tubes chauffage 1er phase (Extension 3165 - zone aérien)	1 semaine	Mar 05.08.25	Lun 11.08.25	47DD+2 semaines	0%
52		Passage tubes chauffage 2ème phase (zone enterrée)	1 mois	Mar 20.01.26	Lun 16.02.26	46	0%

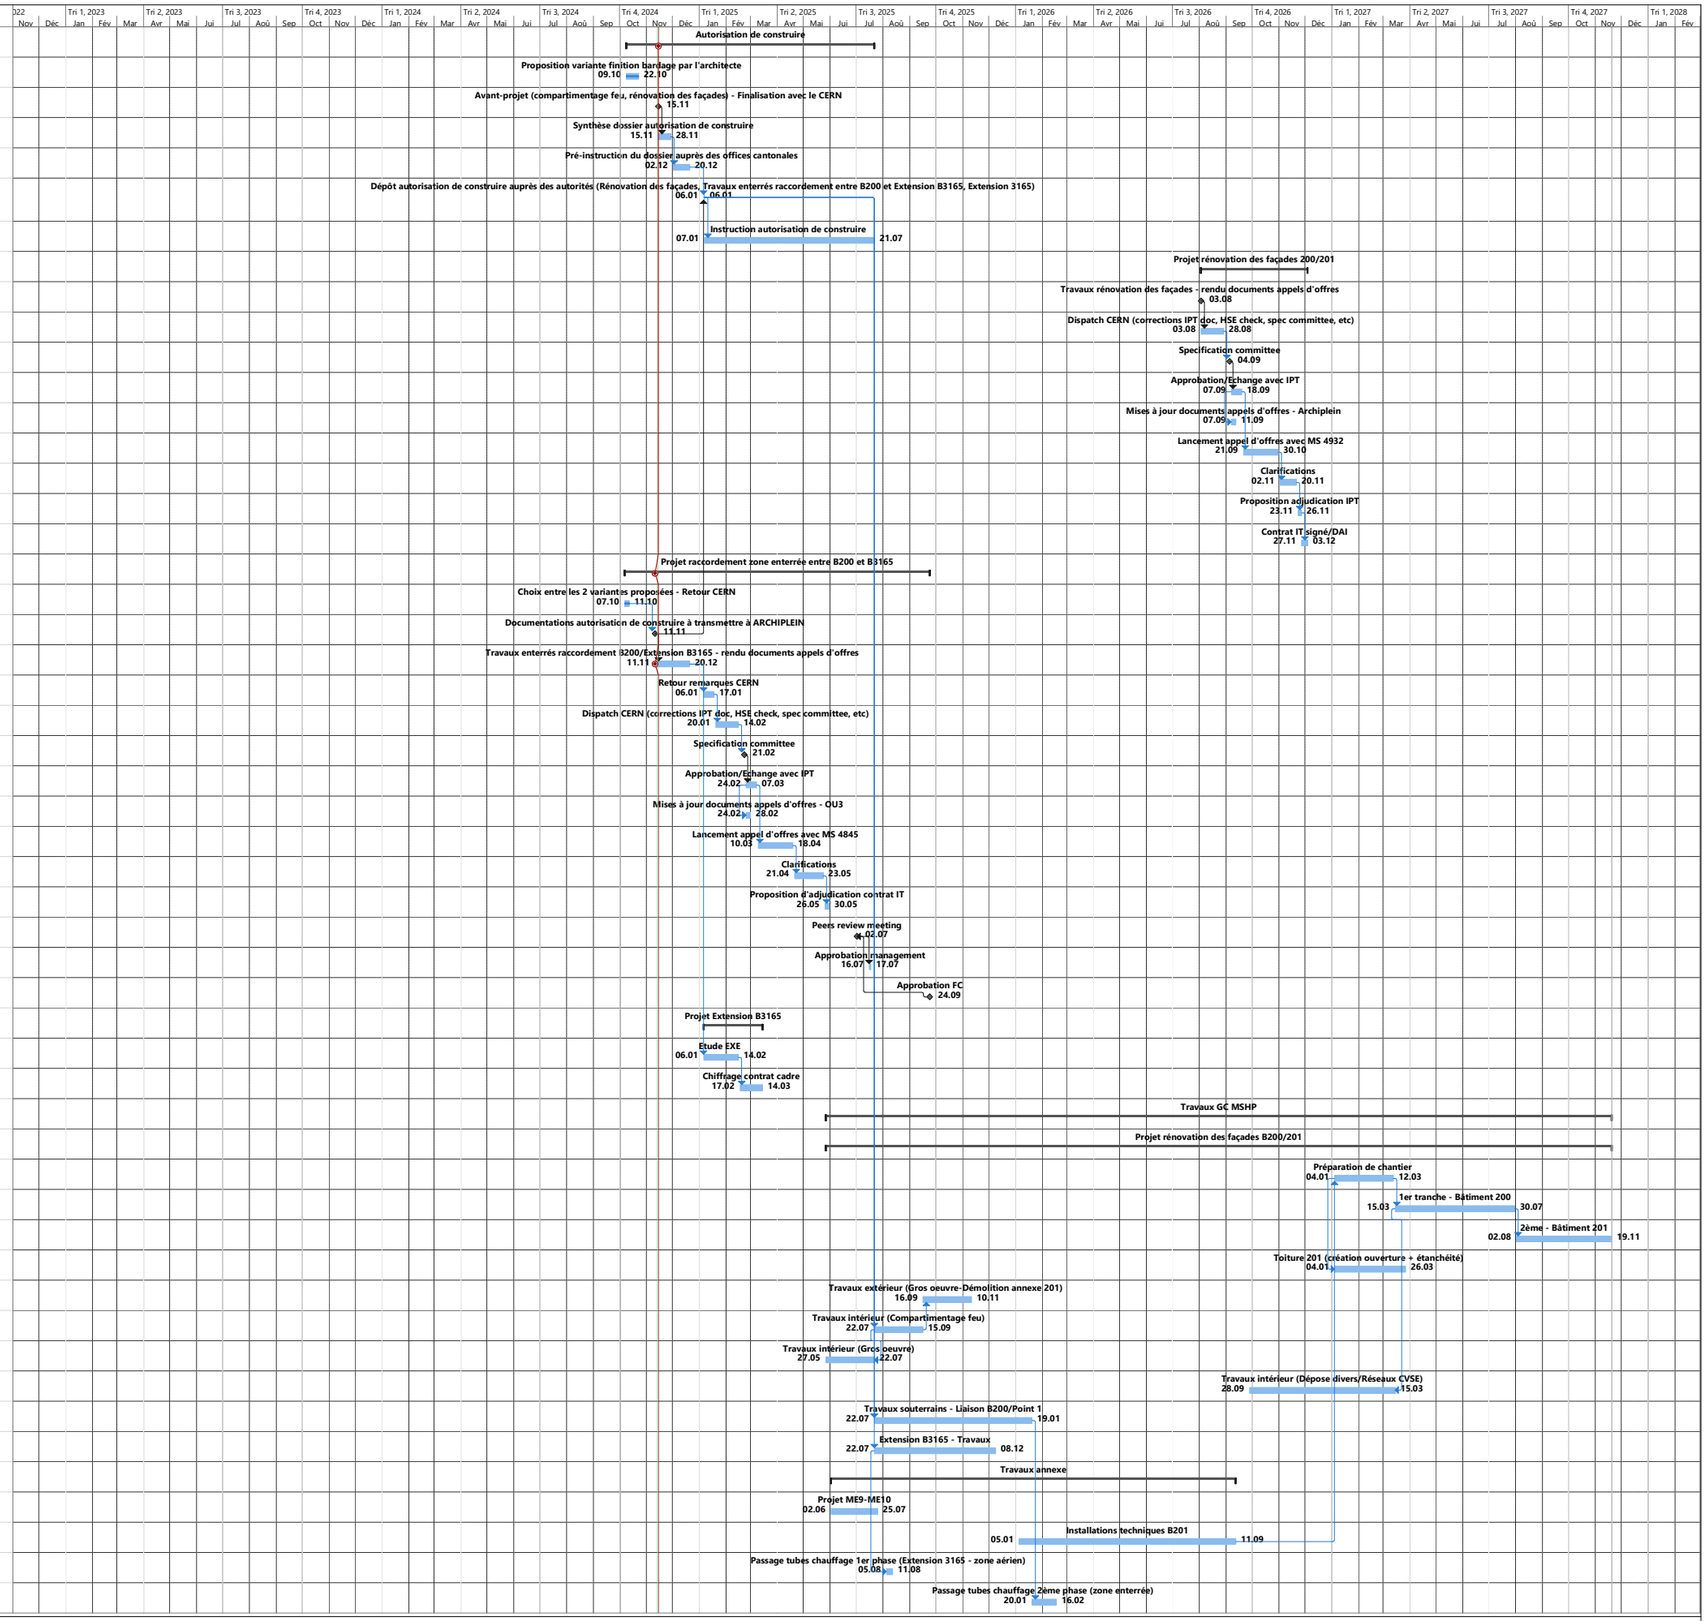

Projet : Planning général
Date : Jeu 14.11.24

Tâche · Jalon · Récapitulatif du projet · Jalon inactif · Tâche manuelle · Report récapitulatif manuel · Début uniquement · Tâches externes · Échéance · Progression manuelle
Fractionnement · Récapitulative · Tâche inactive · Récapitulatif inactif · Durée uniquement · Récapitulatif manuel · Fin uniquement · Jalons externes · Avancement
